

Số: 04/BC-BQL

Phú Vang, ngày 29 tháng 3 năm 2021

BÁO CÁO

Trả lời các nội dung theo phản ánh của người dân trên
trang Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh

Kính gửi :
- Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh
- UBND huyện Phú Vang
- UBND xã Phú Hồ
- UBND xã Phú Lương

Ngày 26/3/2021, Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh đăng bài phản ánh của người dân với tiêu đề '*Phản ánh đoạn đường từ thôn Nam Dương xã Phú Hồ đến thôn Lê Xá Tây xã Phú Lương huyện Phú Vang thi công cho đục lên tạo thành các mốp nhưng cả đoạn không có biển cảnh báo nguy hiểm cho người tham gia giao thông*', sau khi kiểm tra việc triển khai thi công của dự án Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Phú Vang báo cáo như sau:



Công trình Đường liên xã Phú Hồ - Phú Lương được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. Hiện trạng tuyến đường bê tông xi măng rộng 2,5m đã xuống cấp, có nhiều điểm nứt gãy nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình đi lại của nhân dân trong vùng. Công trình được đầu tư nâng cấp mặt đường rộng 3,5m bằng BTXM; lề đường rộng mỗi bên 0,75m; nền đường rộng 5m; Chiều dài tuyến đường được đầu tư nâng cấp khoảng 2500m.

Công trình thi công thuộc tuyến đường liên xã từ xã Phú Hồ đến xã Phú Lương là đường độc đạo có lưu lượng xe chạy tương đối lớn, nhà dân ở hai bên tuyến khá nhiều. Để bảo vệ mặt đường BTXM sau khi đổ, Ban QLDA đã có văn bản gửi địa phương để thông báo cho người dân hạn chế đi lại trên tuyến; Nhà thầu đã bố trí biển báo và rào chắn để cấm phương tiện qua lại. Tuy nhiên, do không có lối tránh khác nên một số phương tiện ô tô, xe máy đã chạy trên mặt đường BTXM mới đổ chưa đạt cường độ, dẫn đến đoạn tuyến khoảng 600m qua địa bàn xã Phú Hồ có hiện tượng bào mòn, tro đá trên bề mặt.

Để khắc phục xử lý mặt đường đoạn tuyến này, chủ đầu tư và tư vấn giám sát đã yêu cầu nhà thầu thực hiện xử lý đổ BTXM lại mặt đường đoạn tuyến theo Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 12 : 2016/TCĐBVN của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, nhà thầu đã có kế hoạch đổ BTXM mặt đường trước ngày 24/3/2021, tuy nhiên do ảnh hưởng đợt gió mùa Đông Bắc vừa qua gây nên mưa lớn khu vực miền trung từ ngày 23/3 đến ngày 25/3 nên đã kéo dài kế hoạch thi công.

Quá trình nhà thầu tiến hành cắt, đào một số đoạn mặt đường không đảm bảo để thi công lại đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật và công tác đúc tạo nhám mặt đường một số đoạn trước khi đổ bê tông đã gây ra khó khăn nhất định trong quá trình đi lại của các phương tiện tham gia giao thông là yếu tố khách quan không mong muốn. Nhà thầu đã tiến hành bố trí các biển báo cảnh báo công trình đang thi công – đi chậm để cảnh báo trong quá trình tham gia giao thông đi lại. Hiện nay, công tác vệ sinh đảm bảo, ngày 27/3 vừa qua nhà thầu đã tiến hành đổ BTXM mặt đường đoạn tuyến trên, đã xử lý dứt điểm để đảm bảo thuận lợi trong quá trình tham gia giao thông đi lại của người dân.


Một số hình ảnh bố trí biển báo cảnh báo thi công công trình:

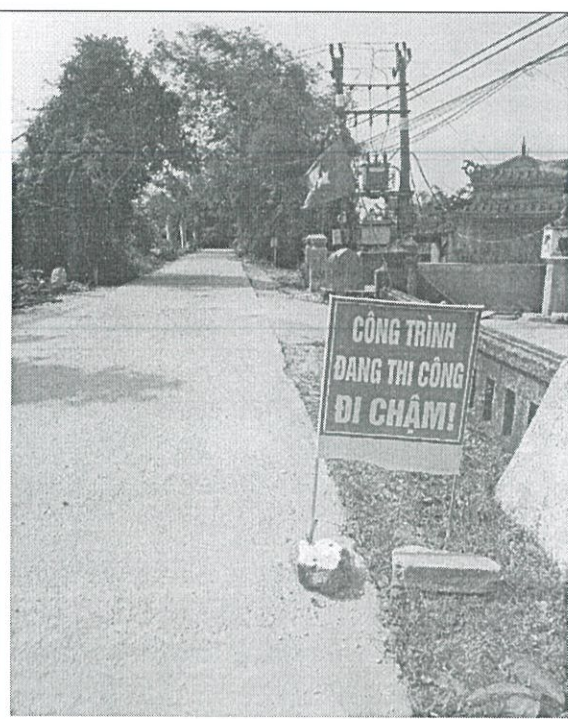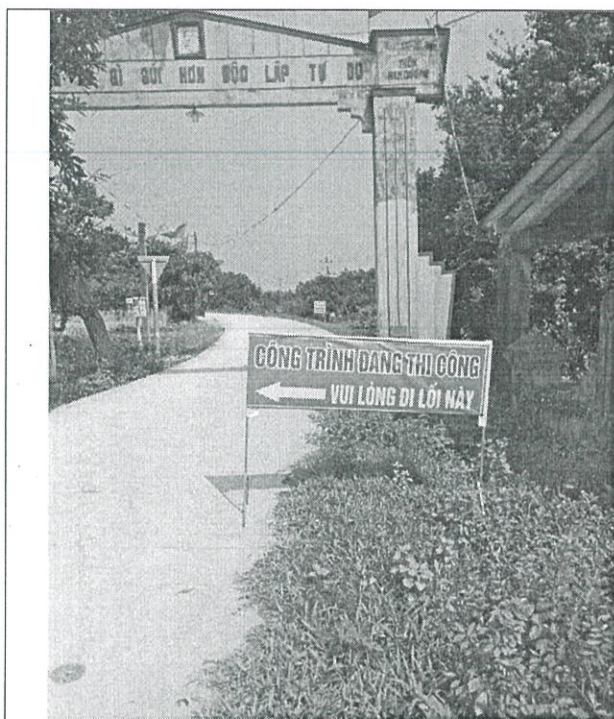

VANG
IL DUY
TUXAY
KHU VI
H.PHUV
10 *

Một số hình ảnh đổ BTXM mặt đường:



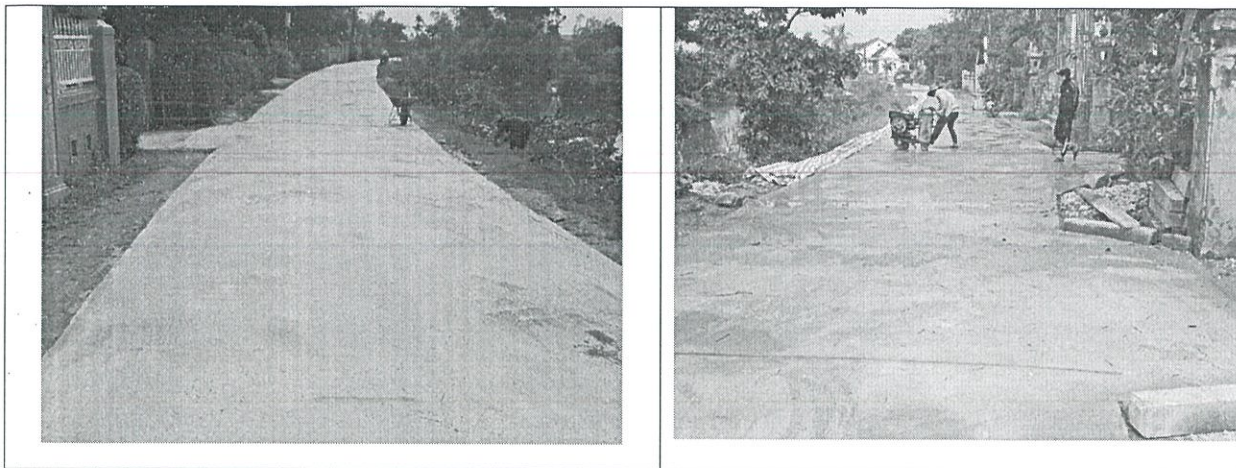

Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực huyện báo cáo UBND huyện, các đơn vị liên quan và toàn thể dân nhân trên địa phương được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD, PGD Ban ;
- Lưu.

GIÁM ĐỐC


Phan Văn Ngọc

